

NOTAT

Sundhedsplatformen
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

Bøllingsvej 30
4100 Ringsted

www.sundhedsplatform.dk

Dato: 31. august 2017

Parathedsvurdering for implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland

Dette notat beskriver kort formålet med de parathedsvurderinger der foretages i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen. Samtidig gives der en vurdering af det netop gennemførte 90 dages parathedsmøde for Region Sjælland.

Parathedsvurderingerne, også kaldet Go Live Readiness Assessment (GLRA), er en del af leverandøren Epics, koncept og iværksættes for at skabe et fælles billede af og ansvar for fremdriften i forhold til klargøring af aktiviteter og leverancer forud for en implementering, blandt, de berørte hospitaler/virksomhedsområder, Regionens egenleveranceprogram og det fællesregionale program for Sundhedsplatformen.

Parathedsmøderne afholdes 120, 90, 60 og 30 dage før Go-live, og der har således været afholdt to parathedsmøder i forbindelse med Go-live i Region Sjælland – 120 dage (som dog blev afholdt 150 før Go-live grundet sommerferien) og senest 90 dages parathedsmødet, der blev afholdt den 23. august 2017.

Det er programmets vurdering, at paratheden i Region Sjælland er yderst tilfredsstillende. I forhold til de tidligere implementeringsbølger i regions Hovedstaden, har man det største andel færdiggjorte tjeks og færrest tjekpunkter der er givet gul eller rød status, jf. nedenfor.

Baggrund


Før parathedsmøderne udarbejdes der i samarbejde med Epic, en tjekliste for en lang række centrale områder. Tjeklisten drøftes og opdateres månedligt for at sikre fremdriften henimod Go-live. Dette sker i samarbejde med KIT/Egenleveranceprogrammet i Region Sjælland, sygehusene, Epic og programmet for Sundhedsplatformen. Derved sikres gennemsigtighed om beslutninger og kritiske områder synliggøres for de involverede parter, således at nødvendige tiltag kan aftales.

Med parathedsmøderne skabes der et overblik på en lang række områder af systemet; bl.a. systembyg (konfiguration af løsningen), den tekniske færdiggørelse, herunder status på integrationer, og forberedelse af uddannelse af brugerne. Dertil kommer status på fremdriften på sygehusene, og Egenleveranceprogrammets klargøring af alle de leverancer der er en forudsætning for implementeringen af Sundhedsplatformen.

Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er kritisk for implementeringen at alle tjeks bliver færdiggjort inden Go-live. Formålet med GLRA møderne er at skabe overblik over opgaver og ansvar – det er naturligvis hensigten at alle opgaver færdiggøres, men mindre udestående opgaver vil ikke være udsættende for Go-live.

Status på parathedsarbejdet i Region Sjælland

Nedenfor ses status på den samlede fremdrift i projektet 150 og 90 dage før implementering i Region Sjælland.

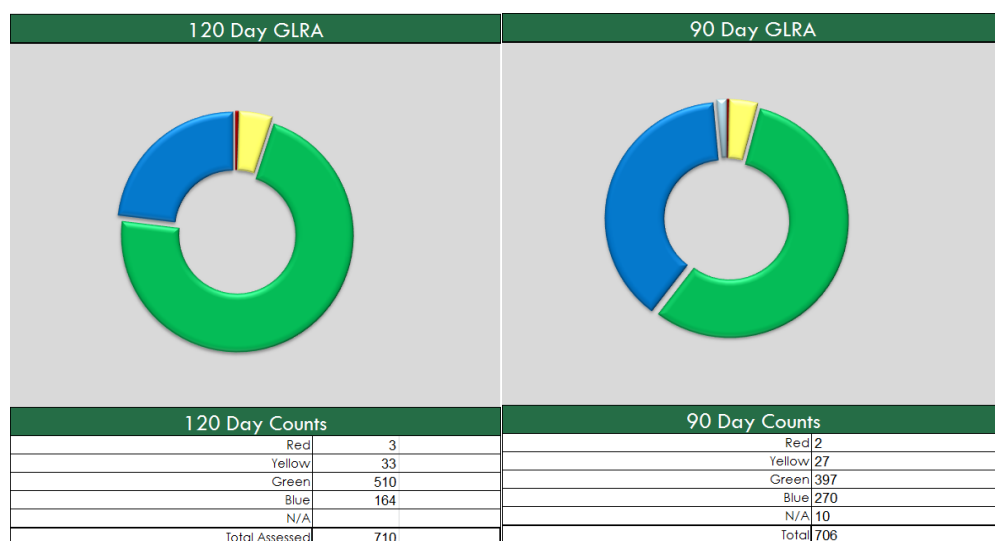

Det betyder farverne:

Rød: Plan udestår. Der er en risiko for ikke at nå planlagt Go-live.

Gul: Leverancer er forsinket, men der er en revurderet plan, der får os tilbage på planen.

Grøn: Aktiviteter følger tidsplanen og bliver klar til Go-live

Blå: Aktiviteter er færdig og klar til Go-live.

N/A: Indikere, at aktiviteten ikke er relevant her.

I forhold til det første parathedsmøde for Region Sjælland var lige over 100 opgaver færdiggjort frem til 90 dages parathedsmødet. Der var en mindre reduktion af tjekpunkter som fortsat krævede bevågenhed (gul status), mens der var 2 tjekpunkter af i alt 706 tjekpunkter, der var i rød. Under selve parathedsmødet blev det afklaret at der i begge tilfælde var tale om manglende kommunikation, hvilket betød at de to røde tjeks (ønske om endnu et testmiljø og en problematik omkring licenser) kunne lukkes. Der var under mødet ingen tjeks der blev vurderet til at skulle gå fra grøn eller gul status til rød status. Der er således pt. ingen røde tjekpunkter for Region Sjælland.

Til sammenligning kan det oplyses, at der ved 90 dages GLRA forud for implementeringen af det første hospital i Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital, var 85 røde og 307 gule tjeks ud af 853 tjeks, mens der på Rigshospitalet konstateredes 9 røde og 67 gule tjeks ud af 681 tjeks.

Denne nedadgående udvikling i røde og gule tjeks, er fortsat i de efterfølgende implementeringsbølger 3 og 4, og er udtryk for, at en lang række udfordringer er blevet løst undervejs, sideløbende med implementeringerne, og at der i programmet er oparbejdet erfaring og viden, som der trækkes på i samarbejdet omkring implementeringen i Region Sjælland.

Programmet vurderer på den baggrund, at der er en god fremdrift i forhold til den kommende implementering i Region Sjælland.

Programmet vil i samarbejde med sygehusene/virksomhedsområderne og KIT/Egenleveranceprogrammet, fortsat have fokus på at eventuelt kommende røde og nye eller eksisterende gule tjekområder blive løst, således at disse også bliver klar forud for Go-live den 25. november 2017.
