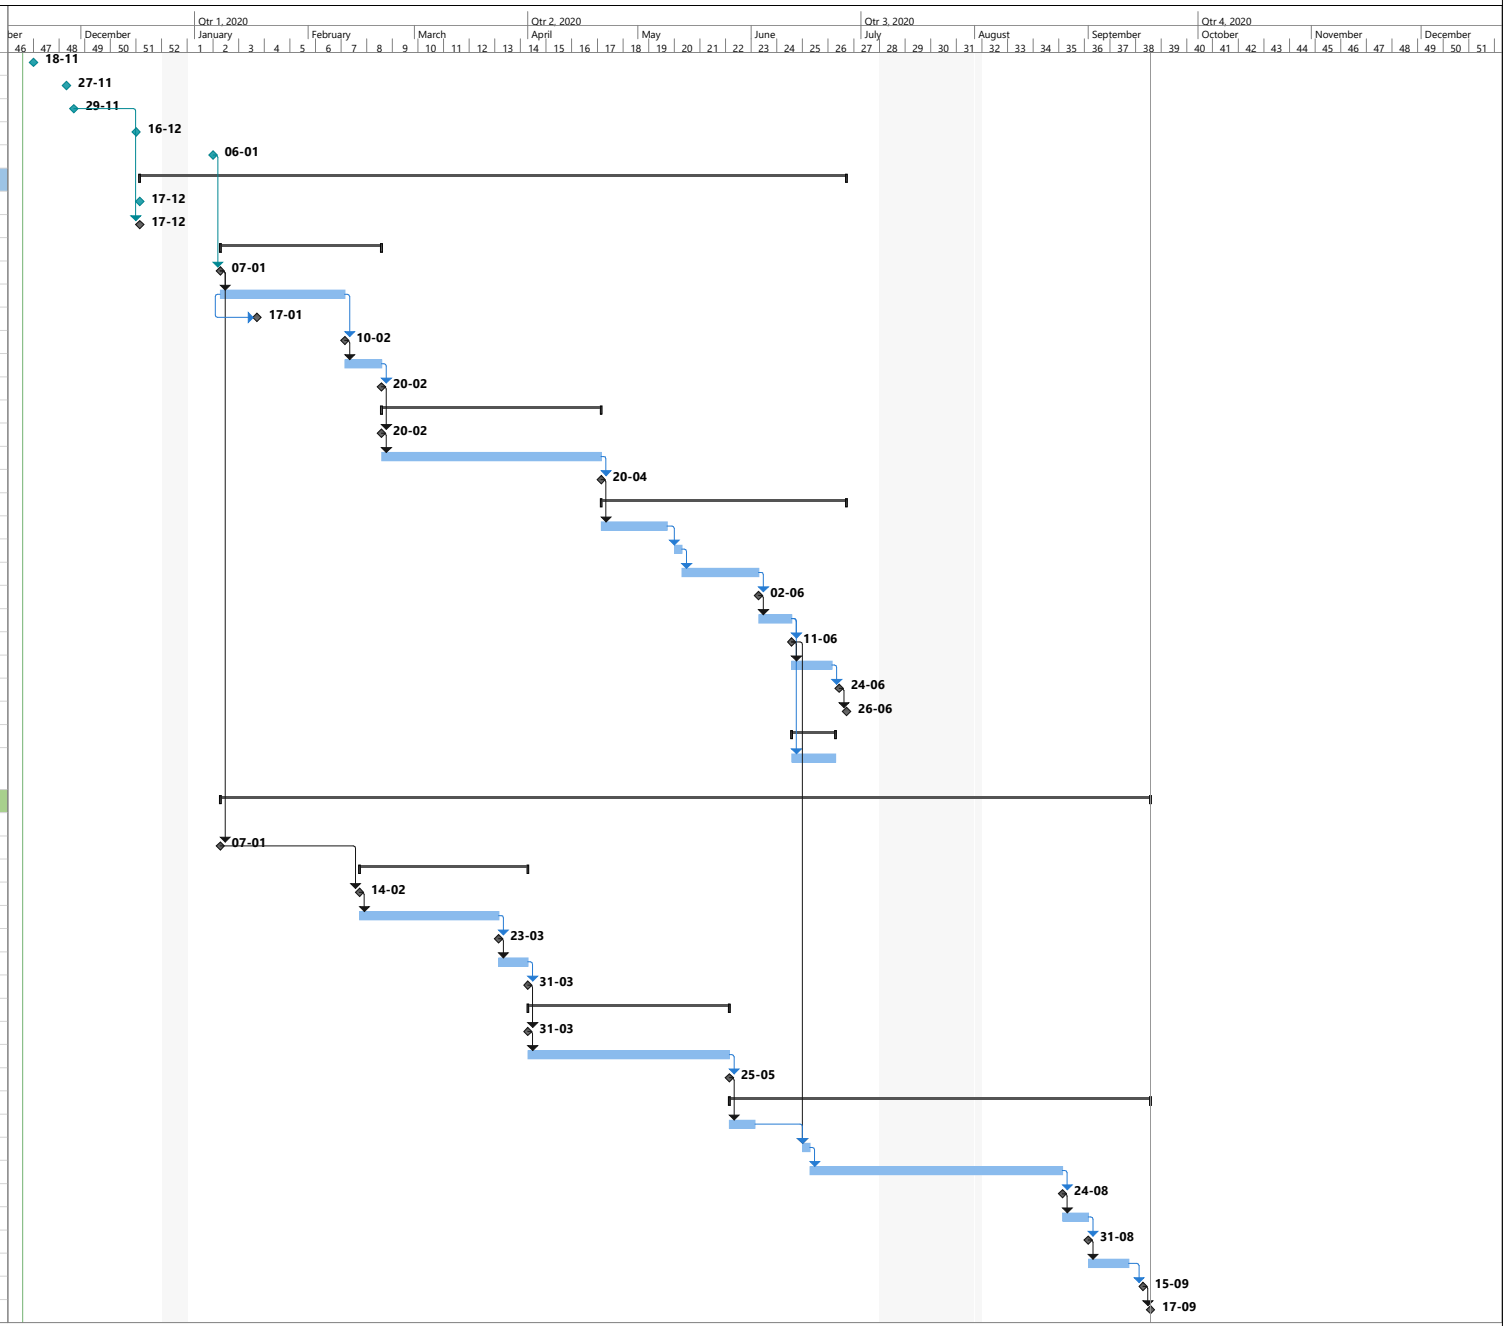ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Godkendelse projektledelse	0 days	Mon 18-11-19	Mon 18-11-19
2	Godkendelse programledelse	0 days	Wed 27-11-19	Wed 27-11-19
3	Godkendelse styregruppe	0 days	Fri 29-11-19	Fri 29-11-19
4	Godkendelse FU	0 days	Mon 16-12-19	Mon 16-12-19
5	Godkendelse RR	0 days	Mon 06-01-20	Mon 06-01-20
6	**Maskinleveranceudbud TE02B-MASK**	**131 days**	**Tue 17-12-19**	**Fri 26-06-20**
7	**Forhåndsmeddelelse**	**0 days**	**Tue 17-12-19**	**Tue 17-12-19**
8	Udsendelse af forhåndsmeddelelse	0 days	Tue 17-12-19	Tue 17-12-19
9	**Prækvalifikation**	**32 days**	**Tue 07-01-20**	**Thu 20-02-20**
10	Udsendelse af udbudsbekendtgørelse	0 days	Tue 07-01-20	Tue 07-01-20
11	Periode for ansøgning om prækvalifikat	34 edays	Tue 07-01-20	Mon 10-02-20
12	Orienteringsmøde	0 days	Fri 17-01-20	Fri 17-01-20
13	Ansøgningsfrist	0 days	Mon 10-02-20	Mon 10-02-20
14	Udvælgelse af tilbudsgivere	8 days	Tue 11-02-20	Thu 20-02-20
15	Afgørelse af prækvalifikation	0 days	Thu 20-02-20	Thu 20-02-20
16	**Tilbudsperiode**	**42 days**	**Thu 20-02-20**	**Mon 20-04-20**
17	Udsendelse af endeligt udbudsmateriali	0 days	Thu 20-02-20	Thu 20-02-20
18	Tilbudsperiode	42 days	Fri 21-02-20	Mon 20-04-20
19	Aflevering	0 days	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20
20	**Forhandling**	**49 days**	**Tue 21-04-20**	**Fri 26-06-20**
21	Evaluering af indledende tilbud	14 days	Tue 21-04-20	Fri 08-05-20
22	Forhandlingsmøde	2 days	Mon 11-05-20	Tue 12-05-20
23	Tilretning af tilbud	15 days	Wed 13-05-20	Tue 02-06-20
24	Aflevering endeligt tilbud	0 days	Tue 02-06-20	Tue 02-06-20
25	Evaluering	7 days	Wed 03-06-20	Thu 11-06-20
26	Tildeling	0 days	Thu 11-06-20	Thu 11-06-20
27	Stand-still	11 edays	Thu 11-06-20	Mon 22-06-20
28	Kontraktmøde	0 days	Wed 24-06-20	Wed 24-06-20
29	Kontraktindgåelse	0 days	Fri 26-06-20	Fri 26-06-20
30	**Tilretning af udbudsmateriale til TE02B-BYG**	**8 days**	**Fri 12-06-20**	**Tue 23-06-20**
31	Tilretning af endeligt udbudsmateriale til totalentreprisen for bygningen	8 days	Fri 12-06-20	Tue 23-06-20
32	**Totalentrepriseudbud TE02B-BYG**	**162 days**	**Tue 07-01-20**	**Thu 17-09-20**
33	**Udbud med forhandling - tidligt udbud**			
34	Forhåndsmeddelelse	0 days	Tue 07-01-20	Tue 07-01-20
35	**Prækvalifikation**	**32 days**	**Fri 14-02-20**	**Tue 31-03-20**
36	Udsendelse af udbudsbekendtgørelse	0 days	Fri 14-02-20	Fri 14-02-20
37	Ansøgningsperiode	38 edays	Fri 14-02-20	Mon 23-03-20
38	Ansøgningsfrist	0 days	Mon 23-03-20	Mon 23-03-20
39	Udvælgelse af tilbudsgivere	6 days	Tue 24-03-20	Tue 31-03-20
40	Afgørelse af prækvalifikation	0 days	Tue 31-03-20	Tue 31-03-20
41	**Tilbudsperiode**	**39 days**	**Tue 31-03-20**	**Mon 25-05-20**
42	Udsendelse af endeligt udbudsmateriali	0 days	Tue 31-03-20	Tue 31-03-20
43	Tilbudsperiode	39 days	Wed 01-04-20	Mon 25-05-20
44	Aflevering	0 days	Mon 25-05-20	Mon 25-05-20
45	**Forhandling**	**63 days**	**Tue 26-05-20**	**Thu 17-09-20**
46	Evaluering af indledende tilbud	5 days	Tue 26-05-20	Mon 01-06-20
47	Forhandlingsmøde	2 days	Mon 15-06-20	Tue 16-06-20
48	Tilretning af tilbud	29 days	Wed 17-06-20	Mon 24-08-20
49	Aflevering endeligt tilbud	0 days	Mon 24-08-20	Mon 24-08-20
50	Evaluering	5 days	Tue 25-08-20	Mon 31-08-20
51	Tildeling	0 days	Mon 31-08-20	Mon 31-08-20
52	Stand-still	11 edays	Mon 31-08-20	Fri 11-09-20
53	Kontraktmøde	0 days	Tue 15-09-20	Tue 15-09-20
54	Kontraktindgåelse	0 days	Thu 17-09-20	Thu 17-09-20
